ボーリング柱状図

調　査　名

事業・工事名

ボーリングNO.									
シートNO.									

ボーリング名	B-2	調査位置				北　緯	36 ° 27 ' 13.0000 "
発注機関	栃木県佐野土木事務所　整備部			調査期間	2009-06-04 ～ 2009-06-12	東　経	139 ° 36 ' 07.0000 "
調査業者名		主任技師		現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者	
孔口標高	256.20 m	角度	180° 上 90° 下 0° 0.00 °	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南 0.00 °	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0° 0.00 °	使用機種	試錐機	ハンマー落下用具	
総掘進長	14.05 m								エンジン	ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	地層岩体区分	孔内水位 (m) ／ 測定月日
					盛土 (BS)	暗褐			厚層基材		
					風化岩 (WR)	暗灰～暗茶			チャートの強風化部(粘土化帯) コアは土砂・礫状		06/08 1.25
	254.70	1.35	1.50		チャート (Cht)	暗灰～灰褐			チャートの風化部 コアは風化・変質により片状・土砂・礫状 全体的に風化している 片状コアは、所々強風化し灰茶褐を呈す 3.85mから砂状呈し、一部礫状		
						灰褐			チャートの弱風化部 コアは密着し片状・柱状 全体的に風化し節理沿いが所々褐色を呈す 全体的に節理多く岩質脆い 所々節理間、破砕状を呈す		
	242.15	12.55	14.05								

標準貫入試験

深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0－10	10－20	20－30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値
1.15	5	5	2	12／30	12
1.45					
2.00	12	10	28／5	50／25	>50
2.25					
3.10	50／5			50／5	>50
3.15					
4.15	50			50／10	>50
4.25					
5.00	50／7			50／7	>50
5.07					
6.10	50／6			50／6	>50
6.16					
7.00	50／5			50／5	>50
7.05					
8.05	50／7			50／7	>50
8.12					
9.05	50／5			50／5	>50
9.10					
10.00	50／5			50／5	>50
10.05					
11.00	50／5			50／5	>50
11.05					
12.05	50／5			50／5	>50
12.10					
13.05	50／3			50／3	>50
13.08					
14.00	50／5			50／5	>50
14.05					

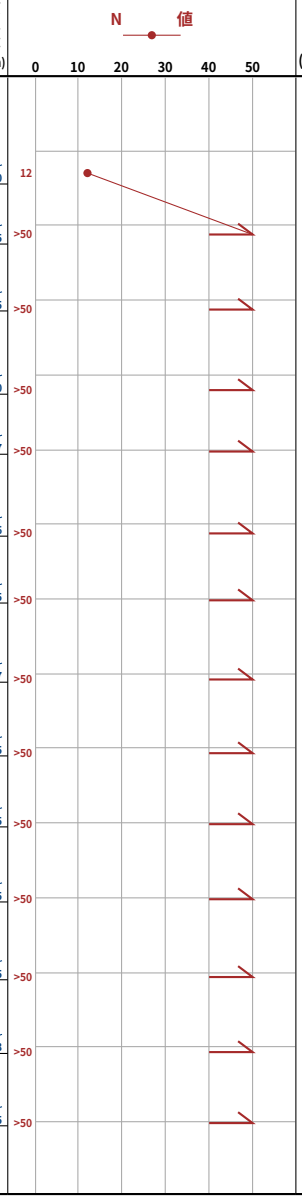

原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験	掘進月日
						06/04
						06/05
						06/06
						06/08
						06/09
						06/10
						06/11
